

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Objednatel: Obec Žižkovo Pole Žižkovo pole 9, 582 22 Žižkovo Pole IČ: 00268569 Zastoupený: Dagmar Bačkovská, starostka obce Email: starosta@zizkovopole.cz Peněžní ústav: Komerční banka a. s. Číslo účtu: 9524521/0100	Zhotovitel: NEST. HB, spol. s r. o. Žižkova 65, 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 2529011 DIČ: CZ25929011 Zastoupený: Libor Neumann, jednatel Peněžní ústav: Česká spořitelna Číslo účtu: 60970082379/0800
--	---

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: Obnova sportovišť v obci Žižkovo Pole

PŘEDMĚT DÍLA: Obnova sportovišť dle SoD

ČÍSLO SMLOUVY: Smlouva o dílo ze dne 25.8.2021, dodatek č. 1 k SoD ze dne 23.9.2021, dodatek č. 2 k SoD ze dne 8.4.2022

TERMÍN ZAHÁJENÍ DÍLA: 1.9.2021

TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA: 31.8.2022


ZÁRUKA: 60 měsíců

Záruka začíná běžet dnem potvrzení tohoto „Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla“ a končí po uplynutí výše uvedených měsíců od splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo.

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ:

ČÍSLO VADY	POPIS VADY ...	SJEDNANÝ TERMÍN ODSTRANĚNÍ VADY	SKUTEČNÝ TERMÍN ODSTRANĚNÍ VADY	PODPIS ZÁSTUPCŮ POTVRZUJÍCÍ ODSTRANĚNÍ VAD

Případné další vady jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu na samostatném protokolu – Soupisu vad a nedodělků

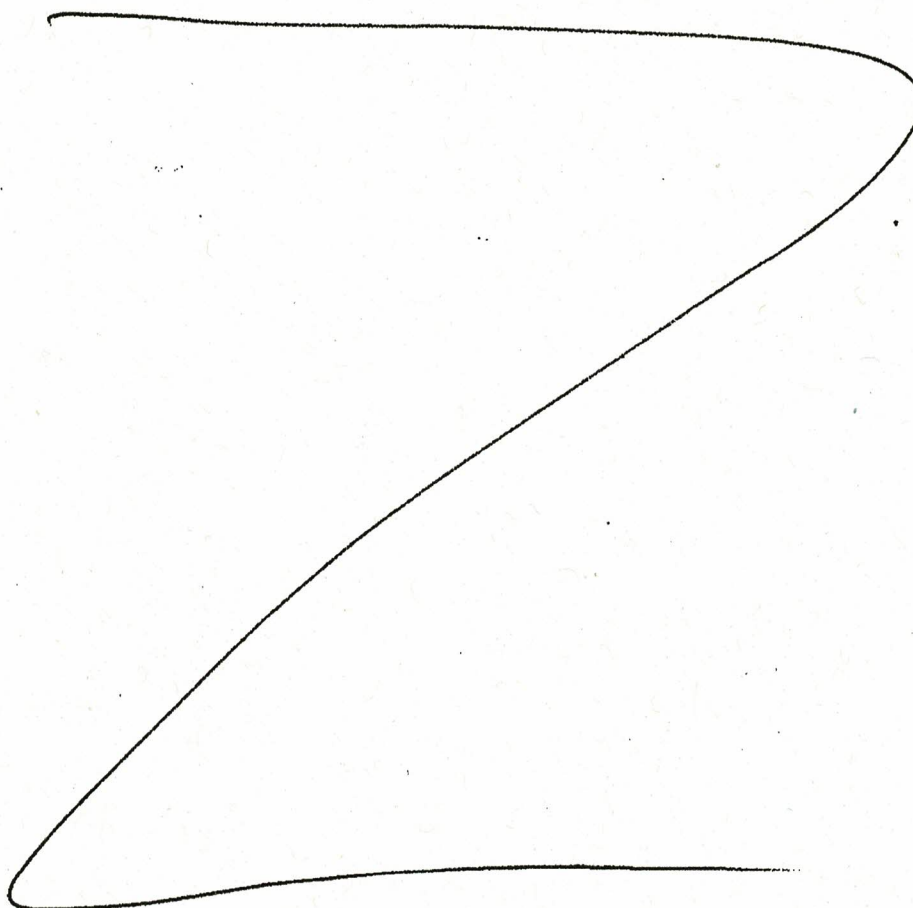

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE:

Podpisem tohoto „Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla“ zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené dílo. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající s uzavřeného smluvního vztahu.

Nedílnou součástí tohoto „Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla“ je „Zajišťovací protokol ke konečné faktuře vč. Soupisu provedených prací, dodávek a služeb“ potvrzený oběma stranami, nezbytných k řádnému dokončení a předání díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s účelem užívání.

POZNÁMKY:

.....
.....
.....



PŘEBÍRAJÍCÍ ZA OBJEDNATELE:

Dagmar Bačková, starostka

31. 8. 2022

Ing. Miroslav Prokeš, místostarosta

31. 8. 2022


.....

.....



PŘEDÁVAJÍCÍ ZA ZHOTOVITELE:

Libor Neumann, jednatel firmy


31. 8. 2022


.....



Příloha č.1 ke konečné faktuře / Soupis provedených prací

31.8.2022

Název stavby: Sociální zařízení kurtů Žižkovo Pole
 Druh stavby: Občanská vybavenost
 Lokalita: Žižkovo Pole
 JKSO:
 Doba výstavby:
 Začátek výstavby: 08.11.2020
 Konec výstavby:
 Zpracováno dne: 08.11.2020
 Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Zpracoval:


C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Celková soustava
								Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
1		122201101R00	Odkopávky nezapuzené v hor. 3 do 100 m3	m3	110,00	166,00	0,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
2		132201110FR00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE	m3	9,00	700,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
3		162201102FR00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	20,00	175,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
4		274571112FR00	Pojistář základu ze šterkopistiku neřiděného	m3	2,00	830,00	927,88	7 882,12	1 660,00	1 660,00	1,94	3,88	RTS II / 2016
5		274313611FR00	Beeton základových pasů prosy C 16/20	m3	9,00	3 250,00	26 364,53	2 885,47	29 250,00	29 250,00	2,53	22,73	RTS II / 2016
6		273311114FR00	Beeton základ. desek prosy z cem. portland C 12/15	m3	7,00	3 450,00	22 395,83	1 754,17	24 150,00	24 150,00	2,59	18,10	RTS II / 2016
7		311271176RT14	Zdivo z tvárnice hladkých tl. 25 cm	m2	15,80	1 370,00	16 212,99	5 433,01	21 646,00	21 646,00	0,13	1,99	RTS II / 2016
8		342255024RT1	Průčky z desek tl. 10 cm	m2	34,00	540,00	11 692,09	6 667,91	18 360,00	18 360,00	0,05	1,79	RTS II / 2016
9		611474611RT1	Omlitka stropů uvnitř dvourásvivá, vápen. štuk, ručně	m2	34,00	480,00	4 491,55	11 828,45	16 320,00	16 320,00	0,03	1,13	RTS II / 2016
10		612472181FR00	Omlitka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	103,00	380,00	3 766,83	35 373,17	39 140,00	39 140,00	0,04	3,68	RTS II / 2016
11		62247531FRU2	Omlitka vnější stěn vyzluzovaná lehčená	m2	51,00	687,00	12 379,12	22 657,88	35 037,00	35 037,00	0,00	0,19	RTS II / 2016
12		632441017RT1	Podlahy z podlahové keramiky	m2	41,00	451,00	10 519,32	7 971,68	18 491,00	18 491,00	0,13	5,42	RTS II / 2016
13		00572100	Osvivo jehel luční červený š 25 kg	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
14		713141123R00	Izolace lepená střeš bodové lep. Imelem, vrstvá	m2	34,00	505,00	5 662,11	11 507,89	17 170,00	17 170,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
15		762332120R12	Montáž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	110,00	266,39	12 805,60	16 497,30	29 302,90	29 302,90	0,01	1,23	RTS II / 2016
16		762341210RT2	všechné dodávky řeziva, hranoly 12/14	m2	100,00	209,70	13 194,90	7 775,10	20 970,00	20 970,00	0,01	1,45	RTS II / 2016
17		762395000R00	všechné dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m3	6,00	1 081,80	6 490,80	0,00	6 490,80	6 490,80	0,02	0,14	RTS II / 2016
18		762812240RT3	Montáž zaklopů, vrchní na sraz, hoblované prkna	m2	34,00	308,70	8 004,35	2 491,45	10 495,80	10 495,80	0,01	0,48	RTS II / 2016

19	765799310RK2	Krytina vývrtá Montáž fólie na krokvě příbřim podstěšní difúzní fólie speciál	m2	95,00	80,00	2 837,77	4 762,23	7 600,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
20	765521311R00	Zvčivý síndel, sklon do 45°	m2	95,00	530,00	27 243,26	23 106,74	50 350,00	0,01	0,82	RTS II / 2016
21	766627453R00	Konstrukce trápníků	kus	7,00	1 600,00	2 807,78	8 392,22	11 200,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
22	76662112R00	Okna zdvojená, do paneví ráh dřevo+Al, 1kt. do 2,1 m2	kus	5,00	4 070,00	0,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	76662122R00	Montáž dveří do ráh, zárubně 1ktfd. š. do 80 cm	kus	1,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
24	771575109RV2	Podlahy z dlaždic Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm lepidlo, spár, hmota	m2	33,40	980,00	4 899,14	27 832,86	32 732,00	0,00	0,11	RTS II / 2016
25	781210131R00	Obkládání stěn obkl. poroum, do tmale do 300x300	m2	40,00	975,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
26	998011001R00	Burcovací systémy Presun hmot pro budovy zděné výšiv do 6 m	t	64,00	380,00	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27	61143800	OSB/Minerál	kus	3,00	2 700,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
28	61143808	Okno plastové jednokřídle 90 x 120 cm OS bílé	kus	4,00	7 300,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,02	0,08	RTS II / 2016
29	61160112	Dveře vnitřní fólie plně 1kt. 80x197 bílé	kus	2,00	1 450,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,02	0,03	RTS II / 2016
30	61173190	Dveře vchodové celokazetové 80x197 cm model K	kus	3,00	10 600,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,04	0,11	RTS II / 2016
31	61173191	Dveře vchodové celokazetové 90x197 cm model K	kus	1,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,04	0,04	RTS II / 2016
32	64214361	Umýváadlo bílé s ořv. bat. 600x490x195mm	kus	2,00	1 350,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,02	0,03	RTS II / 2016
33	64251338	Pisořr keram. s integr. napá. zdrojem	kus	1,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,02	0,02	RTS II / 2016
34	64240056	Misa klozet.závěsná Hanlicap bílá hl.splach.	kus	1,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,02	0,02	RTS II / 2016
35	64234653	Klozet stojící kombinací odpad svíslý	kus	1,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,02	0,02	RTS II / 2016
36	631508605	Pás izolační 3800x1200 tl.160mm	m2	34,00	184,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
				Celkem:		625 431,50					

Poznámka:



NEST. HB spol. s r.o.
-provozování staveb-
-obchodní činnost-

Z: ŽKOVA 65
IČO: 259 29 011
DIČ: CZ25929011

580 01 HAVLICKŮV BŘOJ

Příloha č. 2 ke Konečné faktuře / Soupis provedených prací
Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova sportovišť v obci Žižkovo Pole, dodatek č. 2	Rozpočet: 31.8.2022
Objekt :	Žižkovo Pole	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní				
1		Betonová mazanina podlahy hlazená C20/25 + síť	m3	4,10	5 880,00	24 108,00
2		Izolace proti vodě-asfaltový pás vodorovný	m2	45,00	320,00	14 400,00
3		Zdivo z tvárníc hladkých tl.25 cm	m2	56,20	1 370,00	76 994,00
4		Ztuzující ŽB věnec po obvodu zdiva C25,vč.amn. a bedn.	m3	1,40	12 680,00	17 752,00
5		Omlítky vnitřní stěn štukové,dvouvrstvé	m2	51,00	480,00	24 480,00
6		Ležatá kanalizace vč.výkopu a zásypu,pr.100	m	16,00	1 285,00	20 560,00
7		Přívod vody PE 25-32 vč.výkopu a zásypu	m	10,50	965,00	10 132,50
8		Přesun hmot pro budovy zděné do 6 m	t	34,00	380,00	12 920,00
9						
Celkem za		799 Ostatní				201 346,50



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

